PROPANEL
Construcción Eficiente y Sustentable

Kit Hus 3 | 83 m2
04/11/2026
Nro: WC-1094
Presupuesto válido por 24 horas

Fernando Guerrico 7 A2 7785, Plottier, Argentina
(+54) 9299 4210576
info@propanel.com.ar

Materiales	Imagen	Cantidad	Precio	Total
Panel Sip PROPANEL 9 cm Ver Producto		106	149.056,28	$15.799.965,68
Madera Tirante Multila. 45mmx67mmxUd Ver Producto		133	14.317,40	$1.904.214,20
Tornillo Mad. 6mm x 1 1/2"x100 u. Ver Producto		106	2.897,27	$307.110,62
Tornillo TBS Mad. 6mm x 140mm Ver Producto		531	1.145,64	$608.334,84
Madera Tirante Multila. 35mmx67mmxUd Ver Producto		154	12.472,24	$1.920.724,96
Membrana Autoadhesiva Aluminizada 15cm x 25 mts Ver Producto		3	57.615,39	$172.846,17

Tornillo TBS Mad. 6mm x 200mm Ver Producto		116	2.183,09	$253.238,44
Poliuretano Fischer 750 ml Ver Producto		43	21.818,16	$938.180,88
Barrera Hidrófuga Patagónico Ver Producto		8	59.254,00	$474.032,00
Cinta Patagónico Rollo 25 mts Ver Producto		8	21.018,74	$168.149,92
Adoquín de Hormigón Rectangular Ver Producto		255	1.685,91	$429.907,05
Gancho J 5/16 Galvanizado Ver Producto		102	1.639,82	$167.261,64
Madera Tabla Pino 25mmx90mmxUd Pie de Solera o Apoyo Ver Producto		45	6.114,00	$275.130,00
Tornillo Mad. 6mm x 2" Ver Producto		2.240	40,99	$91.817,60
Membrana Líquida Poliuretánica Blanca Paint Pro 25 kg Ver Producto		6	100.058,70	$600.352,20

Tornillo Hex 17 Autoperforante Madera 14 mm x 2 1/2 Ver Producto		330	204,40	$67.452,00
Bulín Pino 1/2 x 2 x 2,50 mts Ver Producto		33	2.012,94	$66.427,02
Clavadera Pino Secada a Horno 2 x 2 x Mt Ver Producto		83	2.639,40	$219.070,20
			Total:	**$24.464.215,42**

Transferencia Bancaria o depósito:
Banco: Banco de la Provincia del Neuquén
Cuenta Corriente a nombre de PROPANELES SAS
Cuenta: 826718/1
CBU: 0970010910008267180018
Cuit: 30716359464

Enviar comprobante de transferencia/depósito por email a: info@propanel.com.ar
Indicar tipo de factura: A (Resp. Inscripto) ó B (Consumidor Final)
Incluir detalles para facturación: Nombre o Razón Social, Cuit, Dirección.

Contado Efectivo:
Contactar vía WhatsApp al: +54 9299 4210576 para coordinar reunión.

Compra Online:
www.shop.propanel.com.ar

PROPANEL
Construcción Eficiente y Sustentable

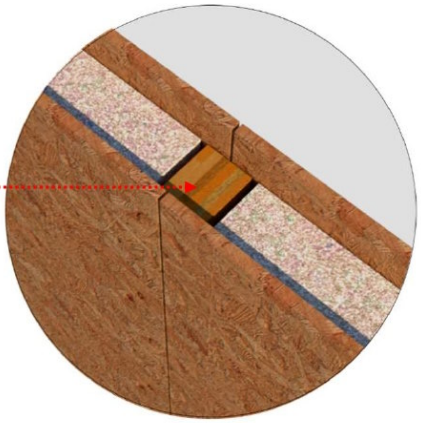

TIRANTES MULTILAMINADOS DE 45mm X 67/87/135mm
Se utilizan para la unión de dos paneles contiguos siendo el ancho variable según el espesor de panel elegido:
- 67 mm en paneles de 9 cm
- 87 mm en paneles de 11 cm
-135 mm en paneles de 15.5 cm

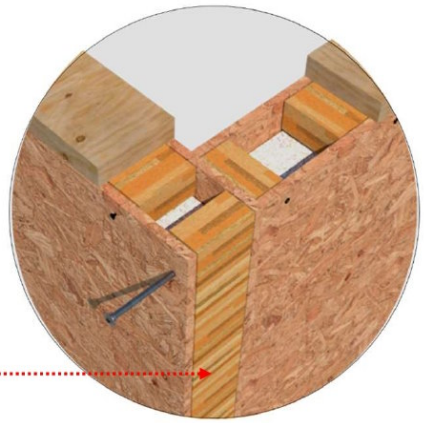

TIRANTES MULTILAMINADOS DE 35mm X 67/87/135mm
Usos: solera inferior, solera superior, cierre en esquinas, cierre de punta d muros, muros de carga o en los bordes de techos. El ancho es variable según el espesor de panel elegido:
- 67 mm en paneles de 9 cm
- 87 mm en paneles de 11 cm
-135 mm en paneles de 15.5 cm

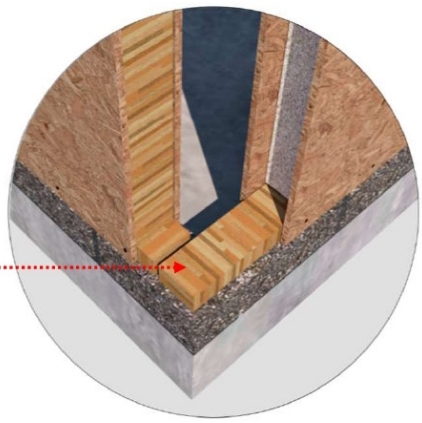

PROPANEL
Construcción Eficiente y Sustentable

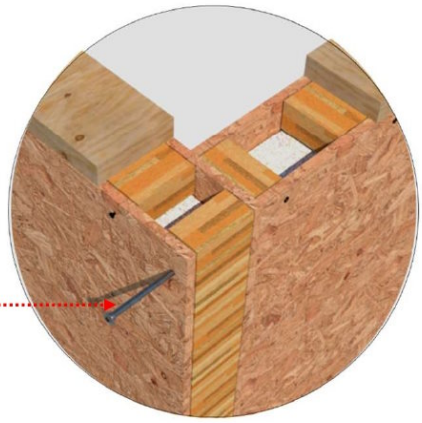

TORNILLOS TBS 6 mm X 140/160/220 mm
El largo varía según el espesor del panel elegido.
Se utilizan para fijar los paneles de muros en esquina o encuentros perpendiculares. Se atornillan cada 50cm.
También se utilizan para fijar los paneles de piso, entrepiso y techo. En este caso se contempla el uso de 9 unidades por panel.

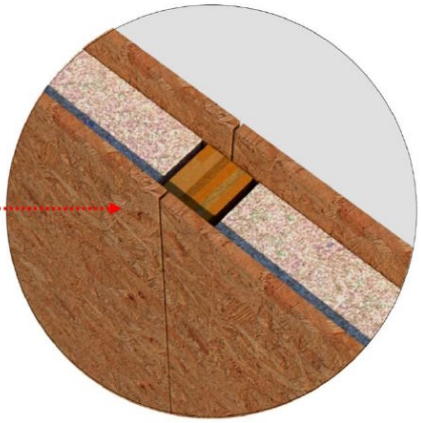

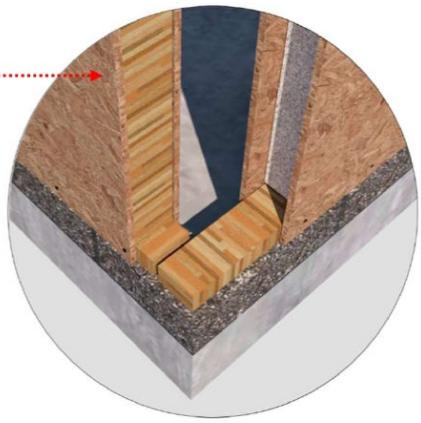

TORNILLOS MADERA 6mm X 1 ½"
Fijación de los paneles a tirantes multilaminados cada 15 cm en todo el perímetro de cada panel y en ambas caras.

PROPANEL
Construcción Eficiente y Sustentable

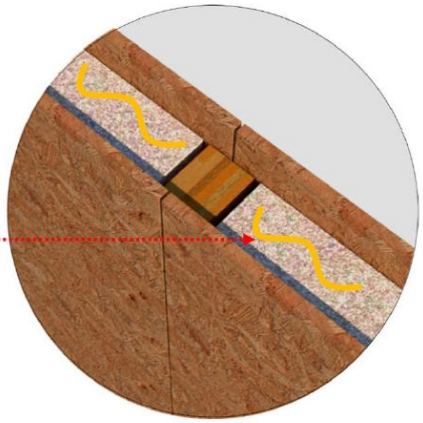

ESPUMA DE POLIURETANO:
Se usa para en el sellado de todas las uniones entre paneles y tirantes multilaminados.

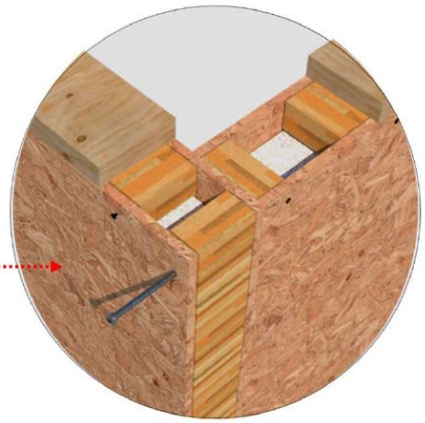

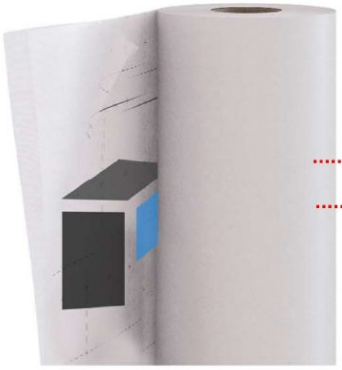

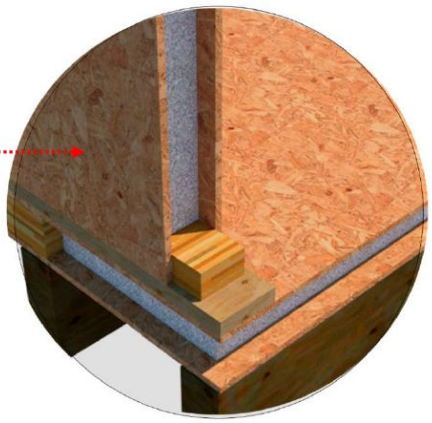

BARRERA DE AGUA Y VIENTO Se utiliza como capa previa a la colocación del revestimiento final exterior, tanto en muros como en techo. En el caso de los techos dependiendo de su ubicación puede ir acompañada de la malla sostén para asegurar un correcto estiramiento de la barrera.

PROPANEL
Construcción Eficiente y Sustentable

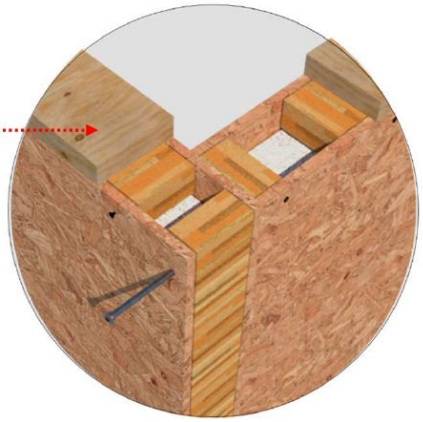

TABLA DE PINO DE 25mm X 90/110/150mm
Usos: pie de solera o apoyo. El ancho es variable según el espesor de panel elegido:
- 90 mm en paneles de 9 cm
- 110 mm en paneles de 11 cm
-150 mm en paneles de 15.5 cm

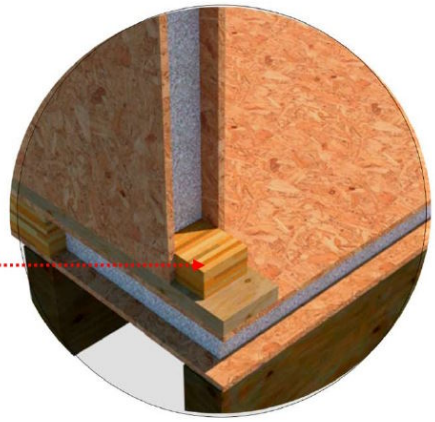

GANCHOS J 5/16 GALVANIZADO 25 CM
Fijación de las soleras inferiores a el cordón elevador y platea. Se instalan cada 42-44 cm al momento del llenado de platea.

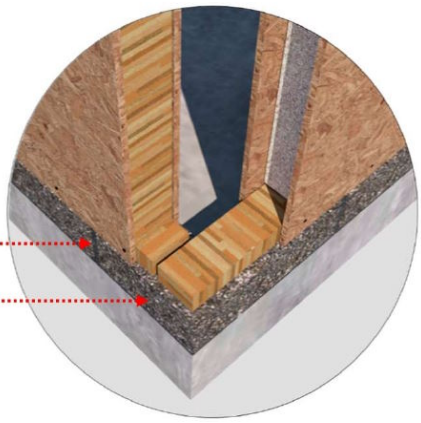

ADOQUÍN DE HORMIGÓN
Se utilizan para realizar el cordón elevador y nivelador sobre el cual se instala la solera inferior.
